


## INFORME DE AVANCE DE OBRA

JULIO 2024

### Torre 7


Durante este mes se realizó el hormigonado la losa de planta baja SECTOR A que consta de 30m<sup>3</sup> y el SECTOR B del subsuelo que es parte también de la cochera con 45m<sup>2</sup>. El mismo se realizó con hormigón elaborado H21 de la empresa TOSCA SUR.

Como próxima tarea en el mes de agosto se planifica colocar las armaduras en las losas, vigas y hormigonar losa SECTOR C- Planta Baja. También nos encontramos realizando los encofrados para columnas para la losa de planta baja del SECTOR B y primer piso SECTOR A.

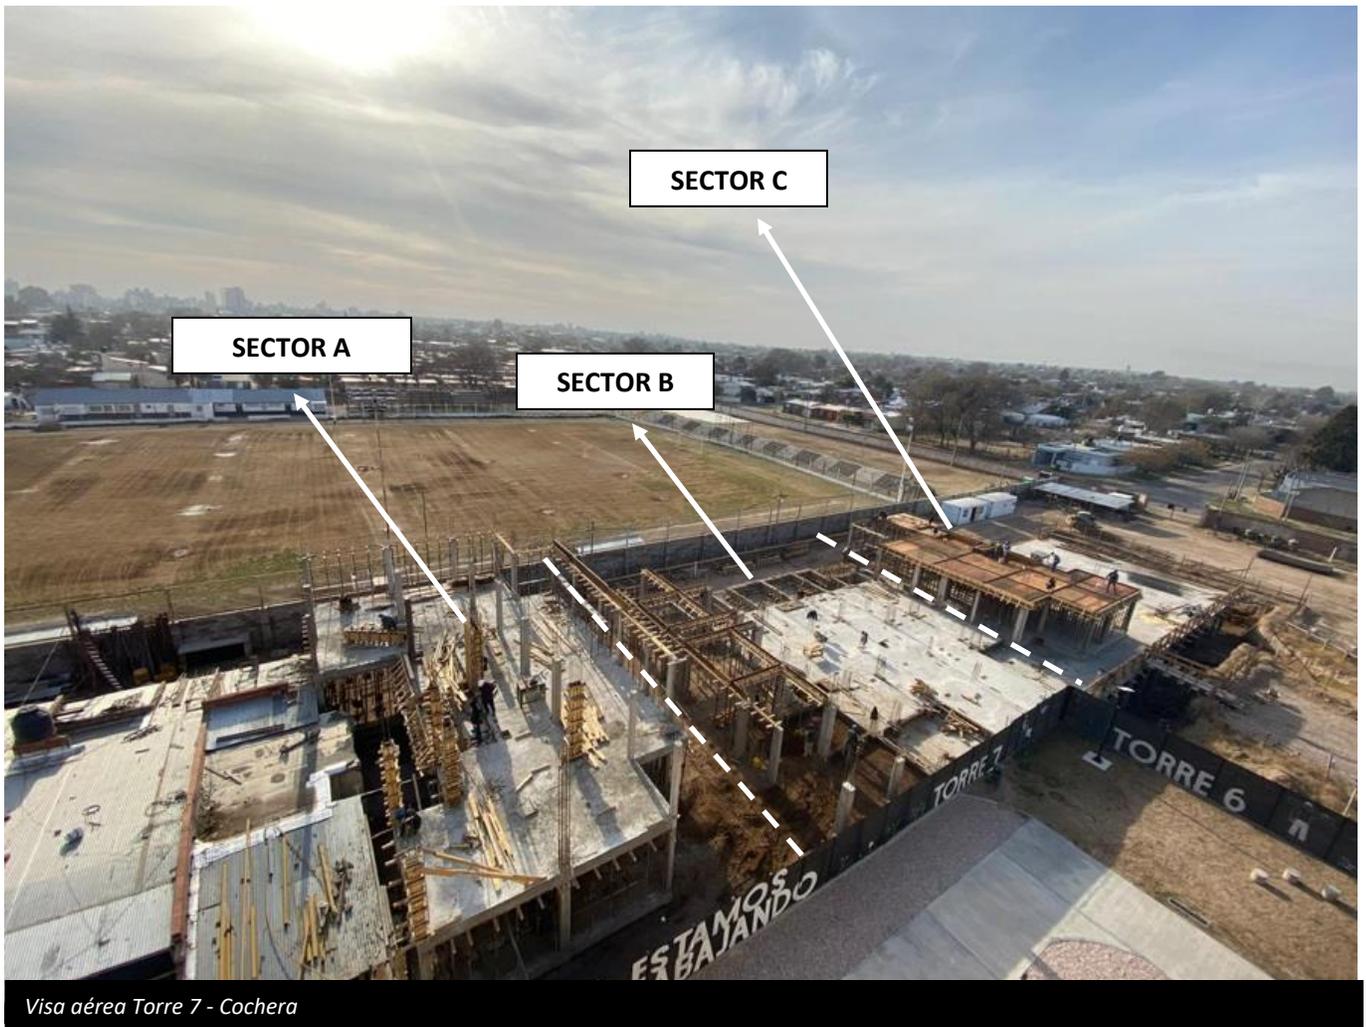

Visa aérea Torre 7 - Cochera

El equipo de trabajo de obra cuenta con 22 personas incluyendo el pañolero y el capataz Miguel Ángel Ferreyra. Se realizaron compras de hierro y hormigón elaborado, para el próximo mes planificamos comprar los caños para los drenes y hierro.




Es un momento clave de la obra para incorporar más personal y tener varios frentes de trabajo, ya que la estructura de la obra así lo permite. Sería sumamente positivo y una gran oportunidad en esta etapa de trabajo una inyección de dinero para poder contratar más recursos y así avanzar y poder adelantar tiempo de construcción.




Hormigón Losa Cochera – SECTOR B




Losa Cochera hormigonada – SECTOR B



Hormigón Losa PLANTA BAJA – SECTOR A

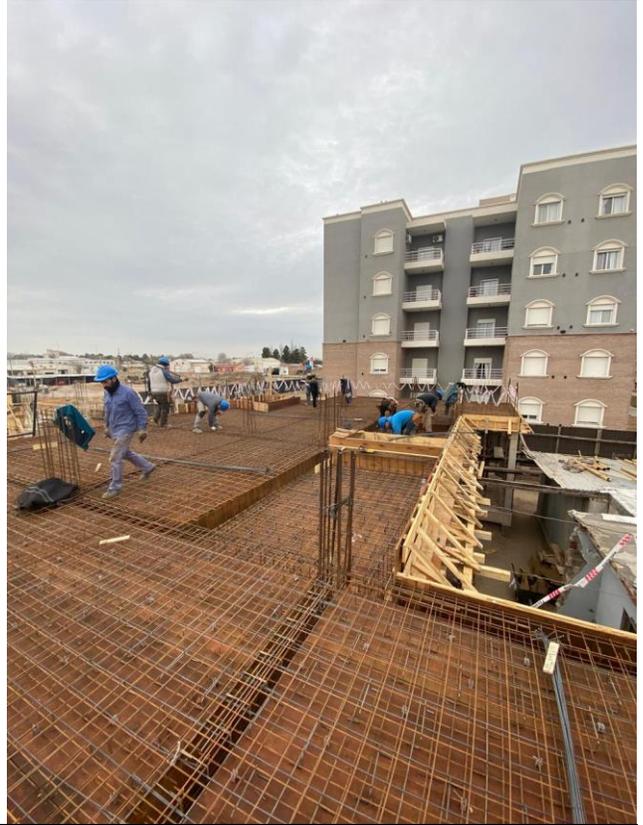

Losa PLANTA BAJA hormigonada – Ejecución de Columnas – SECTOR A



*Columnas PLANTA BAJA – SECTOR A Y C*



*Aporte de suelo y compactación – SECTOR B*
