


INFORME DE AVANCE DE OBRA

ENERO 2025


Torre 7

Durante los meses anteriores se realizó el hormigonado la losa en primer piso SECTOR C y 2do piso SECTOR A. El mismo se realizó con hormigón elaborado H21 de la empresa TOSCA SUR.

Por otro lado, se avanza con el armado de encofrados en losas en segundo piso SECTOR C y 3er piso SECTOR A. Como próxima tarea en el febrero y marzo se planifica armar encofrados, colocar las armaduras en las losas, vigas y hormigonar losa SECTOR B segundo piso.

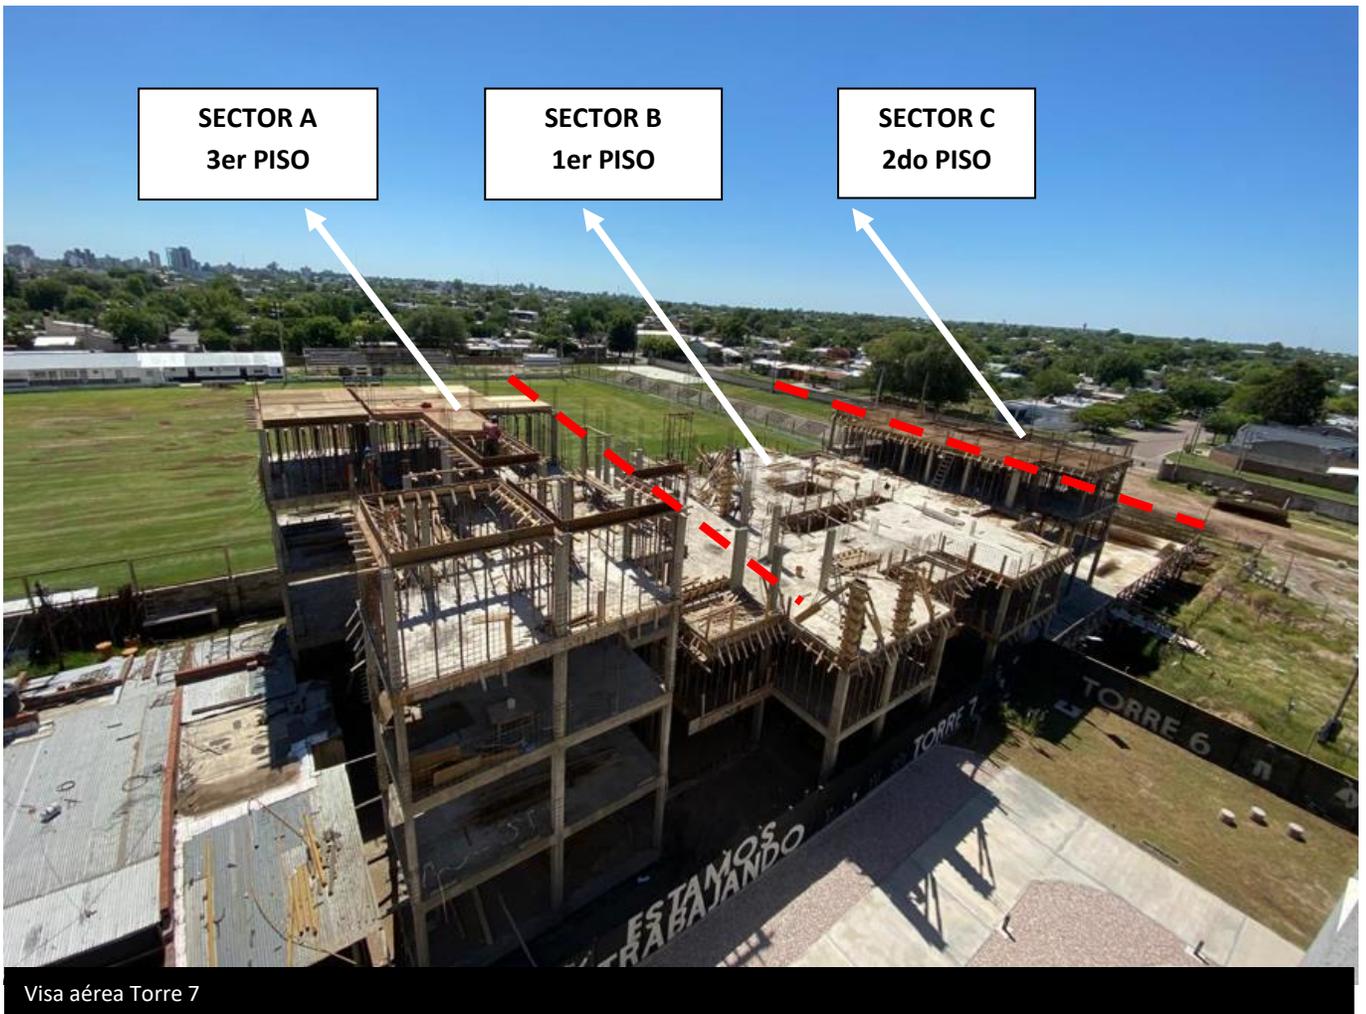

Visa aérea Torre 7



Además, queríamos informar que diariamente se realiza limpieza de obra para evitar que queden elementos peligrosos que pueden producir accidentes. Por otro lado, se realizan limpiezas periódicas en baños, comedor, obradores y palita mini cargadora.


Durante el mes de enero, se otorgaron las licencias correspondientes por vacaciones al personal.



Armado losa con armaduras - 30m3. LOSA SECTOR C – 2DO PISO

El equipo de trabajo de obra cuenta con 25 personas incluyendo el pañolero y el capataz Miguel Ángel Ferreyra. Se realizó compra de hormigón H21 a la empresa TOSCA SUR, cabe destacar que tenemos poco material de stock, **compramos según la demanda de materiales que tengamos en obra.**


Es un momento clave de la obra para poder avanzar con varios frentes de trabajo, es imprescindible la inversión de dinero para acopio de materiales para ganarle a la inflación y adelantar en tiempo de construcción.



Vista. LOSA SECTOR C – 2DO PISO



Armado de vigas. LOSA SECTOR A – 3ER PISO PISO



Construcción de encofrado escalera de primer piso

ARQ. Ana Clara Massa
