

## INFORME DE AVANCE DE OBRA


AGOSTO 2024

### Torre 7

Durante este mes se realizó el hormigonado la losa de planta baja SECTOR C que consta de 30m<sup>3</sup>. El mismo se realizó con hormigón elaborado H21 de la empresa TOSCA SUR.


Por otro lado, se realizaron in-situ vigas de planta baja para completar losa SECTOR B además de realizar aportes de tosca para relleno de suelo.

Como próxima tarea en el mes de agosto se planifica colocar las armaduras en las losas, vigas y hormigonar losa SECTOR B- Planta Baja y SECTOR A – Primer piso.

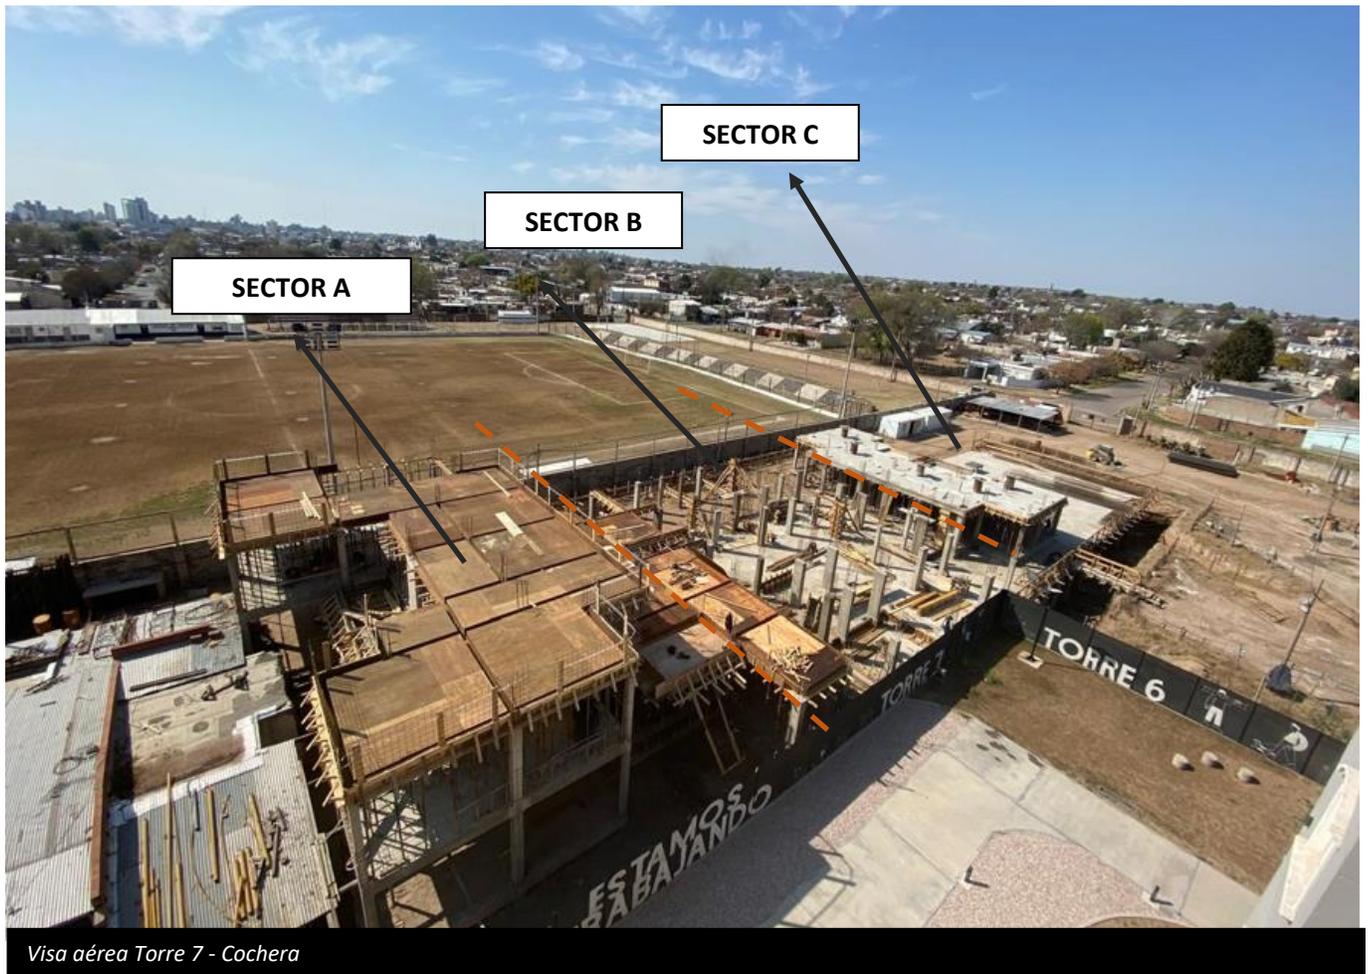

Visa aérea Torre 7 - Cochera

El equipo de trabajo de obra cuenta con 26 personas incluyendo el pañolero y el capataz Miguel Ángel Ferreyra. Se realizaron compras de hierro y drenes para el control de napas de subsuelo. Para el próximo mes planificamos comprar hormigón elaborado, maderas para encofrados y hierro.



Desde lo económico, vuelvo a resaltar la importancia de inyección de dinero para poder contratar más recursos y poder adelantar en tiempo de construcción. Es un momento clave de la obra para tener varios frentes de trabajo, ya que la estructura de la obra así lo permite, sería sumamente positivo y una gran oportunidad.



*Armado de encofrado para Vigas y Compactación de Suelo*



*Desenfofrado y Armado de Vigas de Fundación*
