



## INFORME DE AVANCE DE OBRA


DICIEMBRE 2023

### Torre 7

Durante este mes realizamos las vigas de arrostramiento para las columnas que están sobre suelo (sector A). Continuaremos con las columnas de este sector.

Mensualmente se está comprando un camión con batea de arena y otro de piedra para poder abastecer a la obra de materiales necesarios para la continuidad de obra. Además, se compran palets de cemento semanales y se utiliza la madera que tenemos en stock.

Durante la primera quince del mes de enero, personal de obra se tomará la licencia anual correspondiente.

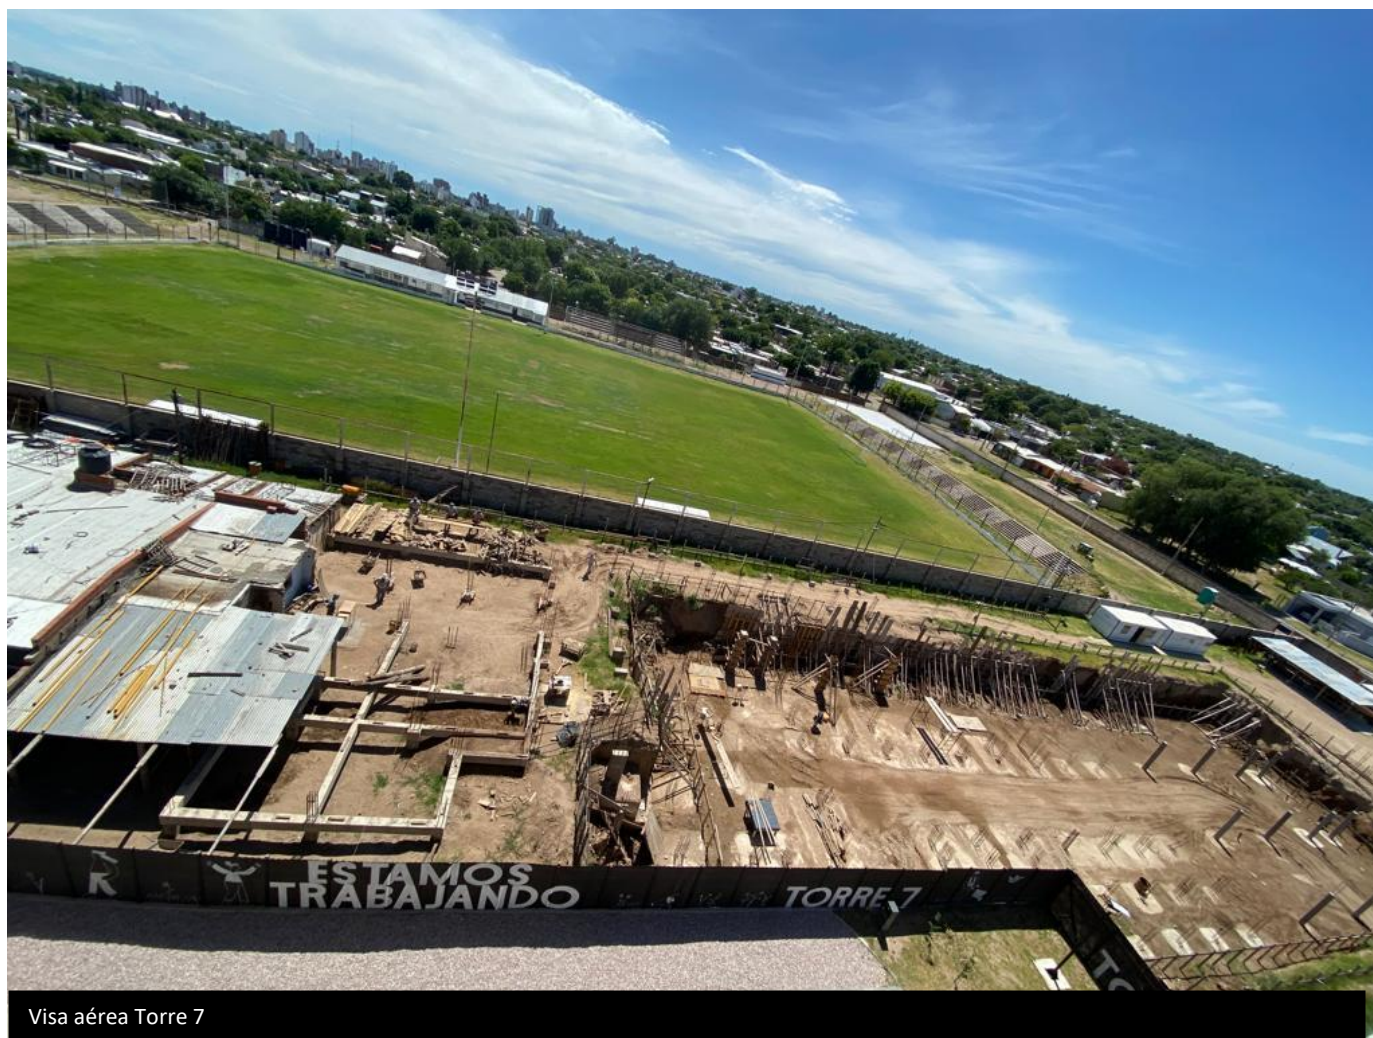

Visa aérea Torre 7



*Vigas de Arriostre sobre planta baja*



Excavación con bases del subsuelo

ARQ. Ana Clara Massa

---
